



Uge 6 Fredag - Status vedr. gulvet i Portrummet og Svikstillingen

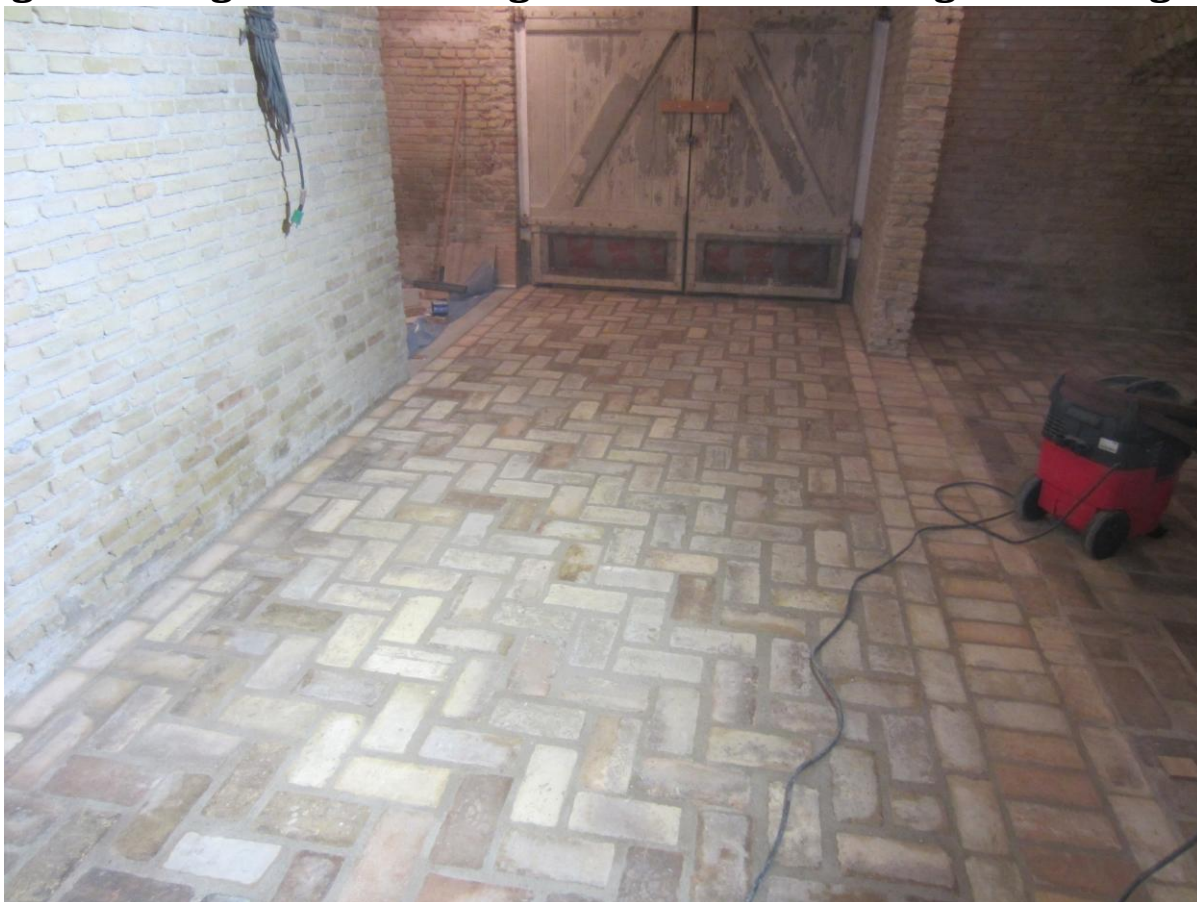

Den store gulv i Portrummet er nu blev lagt.

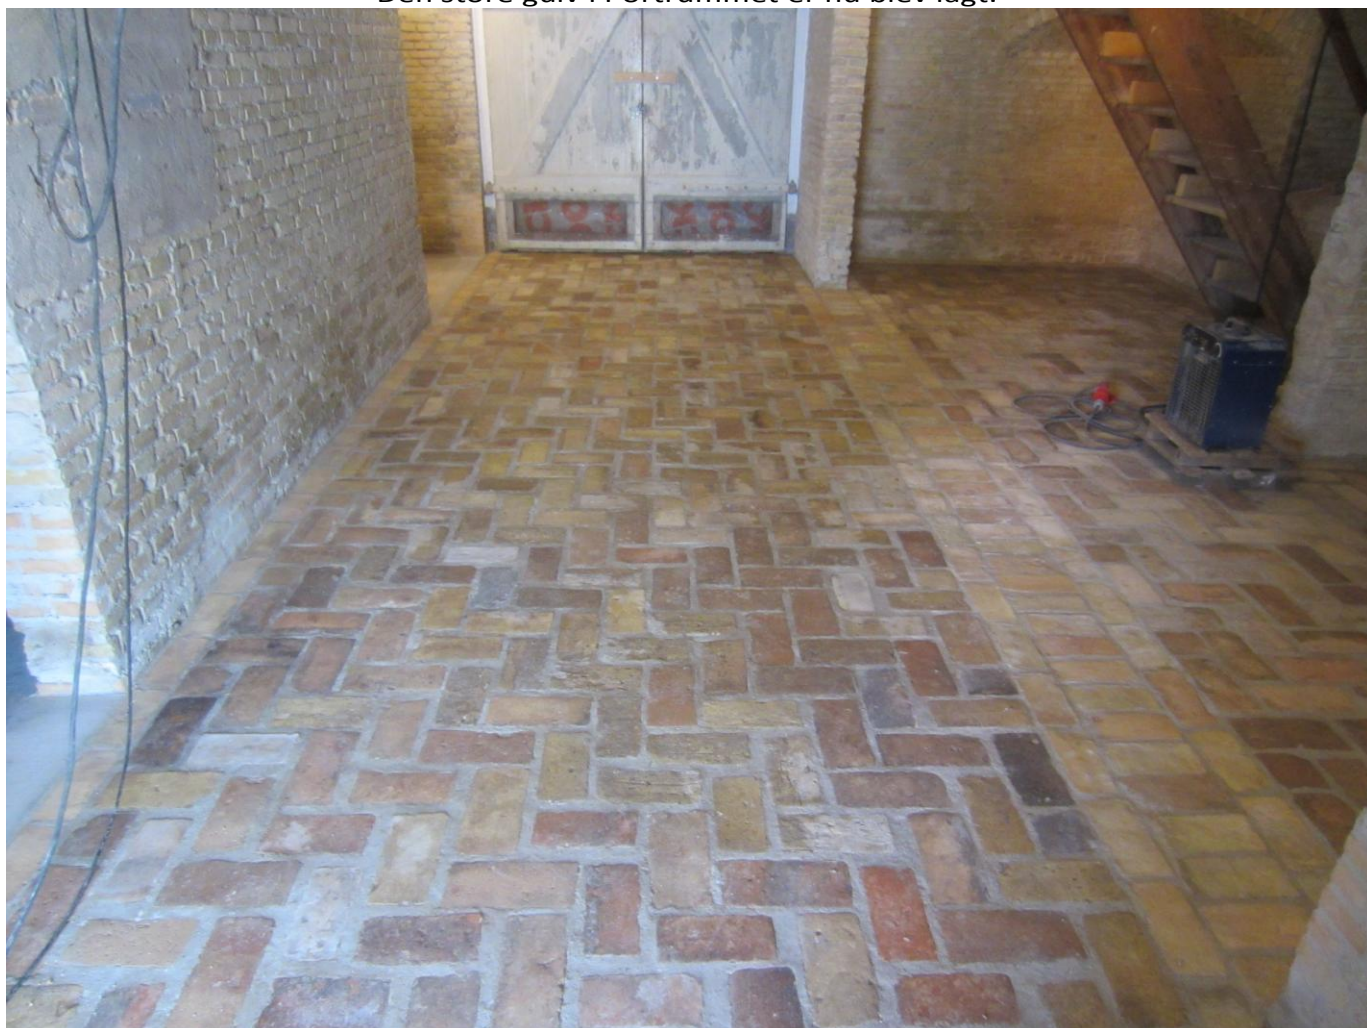

Teglene er håndlavede og derfor svinger de forskellige fuger



Et fint farvespil i de gamle sten fra kirkegulvet

Erhvervskolens tømrerlærlinge i afsluttende skolepraktik er gået i gang med Svikstillingen



Først blev de 8 vandrette hjørneremme boltet på plads

Et stort Puslespil skal passes til. De 8 vandrette bærende remme er nu sat op i hjørnerne. Ind imellem disse skal sættes kortere remme op så der dannes en regelmæssig ottekant.



Der måles og saves til



3 vandrette remme mellem hver 2 hjørneremme. I alt 32 stk.



Den første støttestole ud af 32 er nu sat op.
